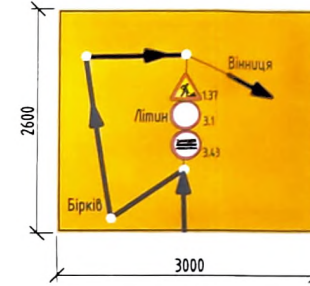


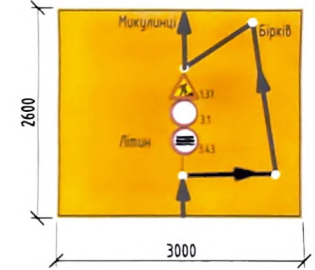


Схема організації дорожнього руху (об'їзду) під час ремонту

Знак індивідуального проектування 5.56.1



Знак індивідуального проектування 5.56.2



Таблиця дорожніх знаків

Номер дорожнього знака згідно ДСТУ 4100-2014	Кількість, шт		ДЗІП
	I	II	
1	2	3	4
1.37	2	-	-
3.1	4	-	-
3.4.3	4	-	-
5.56.1	-	-	1
5.56.2	-	-	1
5.57.2	5	-	-
5.57.3	6	-	-
7.1.1	2	-	-
Всього	23	-	2

- Примітки:
- Огородження та організація дорожнього руху на даній ділянці були виконані згідно з ДСТУ 8749:2017.
 - Установлення знаків для тимчасового регулювання дорожнього руху здійснювати згідно ДСТУ 4100:2014.
 - Знаки індивідуального проектування виконувати згідно ДСТУ 4100:2014.
 - Знаки 1.37, 3.1 та 3.4.3 встановити на поперечні бар'єри довжиною по 5м з кожного боку.

					В.24-04-20-ОДР			
					Капітальний ремонт мосту на км. 2+230 автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0-02-11-02 Літин - Біркив в межах Вінницької області.			
Змін.	Кільк.	Аркцш № док.	Підпис	Дата	Організація дорожнього руху	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Нач. відділу		Романенко А.В.	<i>[Signature]</i>			РП	9	
Виконав		Слободенюк О.А.	<i>[Signature]</i>		Схема організації дорожнього руху (об'їзду) під час ремонту	ТОВ "Гервін Проект"		
Перевірив		Романенко А.В.	<i>[Signature]</i>					
Н. Контр.		Войцехівський Г.О.	<i>[Signature]</i>					

Зам. інв. №
Підпис і дата
Інв. № організації
04/20-ПТ
