


Організація дорожнього руху при проведенні дорожньо-ремонтних робіт

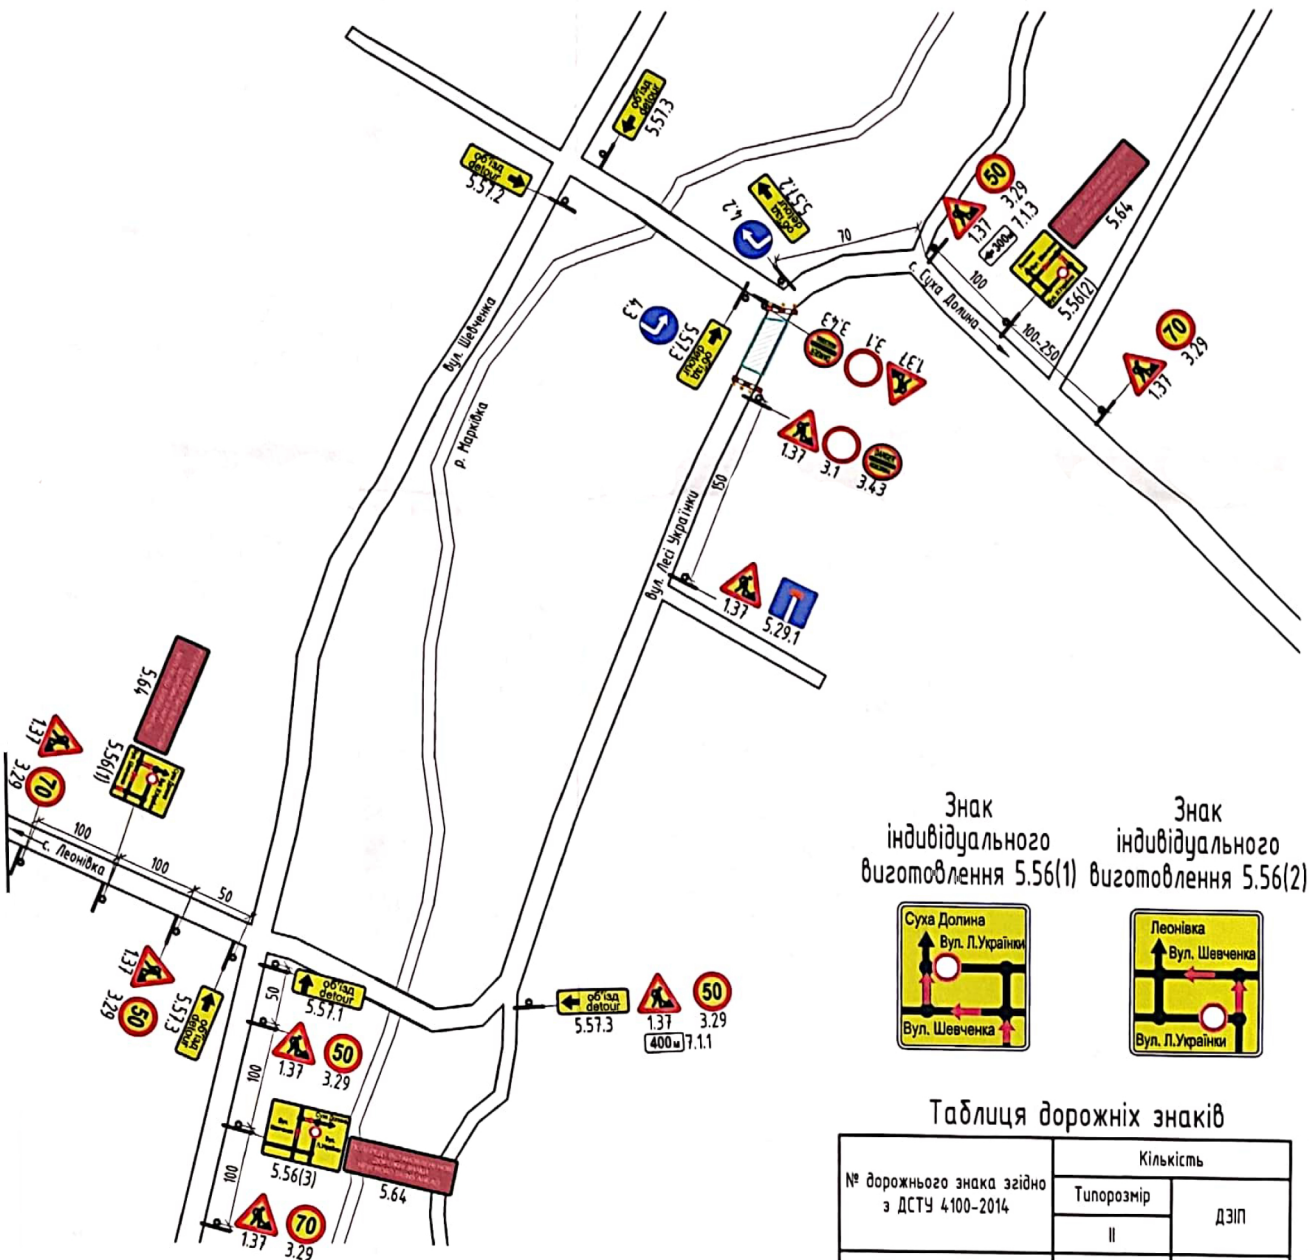

Умовні позначення:

- (ОБ) - огорожувальний бар'єр
- ділянка дорожньо-ремонтних робіт
- маячок або ліхтар
- дорожній знак

Знак індивідуального виготовлення 5.56(3)



Знак індивідуального виготовлення 5.56(1) Знак індивідуального виготовлення 5.56(2)



Таблиця дорожніх знаків

№ дорожнього знака згідно з ДСТУ 4100-2014	Кількість	
	Типорозмір	ДЗП
1.37	5	
3.1	2	
3.43	2	
4.2	1	
4.3	1	
5.29.1	1	
5.56		3
5.57.1	1	
5.57.2	2	
5.57.3	4	
5.64	3	

Примітки:

1. Огородження та організація дорожнього руху на даній ділянці були виконані згідно з ДСТУ 8749:2017.
2. Установлення знаків для тимчасового регулювання дорожнього руху здійснювати згідно ДСТУ 4100:2014.
3. Знаки індивідуального проектування виконувати згідно ДСТУ 4100:2014.
4. Розміри на схемі в метрах.

В.49-12-19-АБ					Капітальний ремонт водопропусної споруди на км 9+092 автомобільної дороги загального користування місцевого значення С-02-09-04 Петрурівка - Суха Долина в межах Вінницької області				
Змін.	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата	Архітектурно-будівельні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
		Ялоб				Архітектурно-будівельні рішення	РП	1	
Н.контр.		Войцехівський					Організація дорожнього руху при проведенні дорожньо-ремонтних робіт		
Перевірив		Вальчук							
Розробив		Войцехівська			02.2020				

ТОВ "ГЕРВІН ПРОЕКТ"
